

F. & E. JOURDAN * BAUGESCHÄFT

TELEPHON SAFRAN 6011

POSTCHECKKONTO V 1524

MUTTENZ, DEN 31. Dezember 1932.
31. März 1933.

RECHNUNG FÜR Herrn Hans Ramstein - Gerster

M u t t e n z .

1932.		A.	M.	H.	Taglohnarbeiten.		Betrag
Sept.	9.	8		16	<u>Rapport No. 1.</u> Material aufladen		
"	10.	3½		10	<u>Rapport No. 2.</u> Material aufladen		
"	12.	8		18	<u>Rapport No. 3.</u> Material aufladen		
"	14.	6		12	<u>Rapport No. 4.</u> Material aufladen		
"	29.			12	<u>Rapport No. 5.</u> Wasserleitungsgraben ausgraben		
"	30.			18	<u>Rapport No. 6.</u> Wasserleitungsgraben ausgraben		
kt.	1.			8	<u>Rapport No. 7.</u> Wasserleitungsgraben ausgraben		
"	1.		1		<u>Rapport No. 8.</u> Beihilfe an Centralheizungsmoniteurs		
"	3.			9	<u>Rapport No. 9.</u> Löcher spitzen 4 Spitzseisen	- .50	2. --
"	4.		4		<u>Rapport No. 10.</u> 1 Spitzseisen für Consolen versetzen	- .50	- .50
"	5.		13		<u>Rapport No. 11.</u> Löcher spitzen & Consolen versetzen 3 Spitzseisen	- .50	1.50
		25½	18	103	Ueberträge	Fr.	4. --

KURB.

ZAHLBAR INNERT 30 TAGEN

No.

932.	A.	M.	H.			Betrag
	25 $\frac{1}{2}$	18	103	Ueberträge	Fr.	4.--
kt.	6.	18		<u>Rapport No. 12.</u>		
				Beihilfe an Centralheizungsmonteure		
				5 Spitz Eisen	- .50	2.50
"	7.		5	<u>Rapport No. 13.</u>		
"	8.			Wasserleitungsgraben zudecken		
	19.	68 $\frac{1}{2}$	9	<u>Rapport No. 14.</u>		
				Beihilfe an Centralheizungsmonteure		
				15 Spitz Eisen	- .50	7.50
"	20.					
	31.	25	5	<u>Rapport No. 15.</u>		
				Beihilfe an Centralheizungsmonteure		
				1 Pfostament für Waschmaschine er-		
				stellen und Neubau reinigen.		
				6 Spitz Eisen	- .50	3.--
				6 Karren Sand	1.--	6.--
				2 $\frac{1}{2}$ \$ Cement	3.20	8.--
				1 \$ Schwarzkalk	3.--	3.--
				30 Stück Normalsteine	- .11	3.30
				10 kg. Grenoble	- .30	3.--
				10 kg. Gips	- .12	1.20
ov.	1/4.	6		<u>Rapport No. 16.</u>		
				Löcher zumauern		
				5 Kessel Cementpflaster	1.50	7.50
"	8.	2		<u>Rapport No. 17.</u>		
				Futterrohr in Waschküche versetzt		
				1 Kessel Cementpflaster	1.50	1.50
				2 Spitz Eisen	- .50	1.--
"	9.	1 $\frac{1}{2}$		<u>Rapport No. 18.</u>		
				Löcher zuputzen		
				1 Kessel Cementpflaster	1.50	1.50
"	15.	5		<u>Rapport No. 19.</u>		
				Löcher spitzen und Eisen einsetzen		
				zum Draht einziehen.		
"	16.	6		<u>Rapport No. 20.</u>		
				Löcher schlagen und Eisen versetzen		
				für Lander-Reben.		
				1 Kessel Cementpflaster	1.50	1.50
				2 Spitz Eisen	- .50	1.--
"	18.	8		<u>Rapport No. 21.</u>		
				Treppenplatten versetzen		
	25 $\frac{1}{2}$	158	122	Ueberträge	Fr.	55.50

110

110

110

110

110

110

110

110

110


932.		A.	M.	H.			Fr.	Belrag
		25½	158	122	Ueberträge			55.50
Nov.	19.		1		<u>Rapport No. 22.</u> Treppenplatten versetzen			
"	21.		4		<u>Rapport No. 23.</u> Treppenplatten versetzen			
"	24.			4	<u>Rapport No. 24.</u> Mergel in den Garten gefahren			
Dez.	8.	1½		4½	<u>Rapport No. 25.</u> Trotte nach dem Neubau geführt			
"	27.		4		<u>Rapport No. 26.</u> Abspitzen der südlichen Mauerbrüstung in der Veranda und Aufmauern des Hohlraumes. ½ \$ Cement 1 Karrete Sand 2 Spitz Eisen Stunden Auto	3.20 1.-- -.50 6.--	1.60 1.-- 1.-- 162.--	
		27			" Maurer	2.30		384.10
			167		" Handlanger	1.80		234.90
				130½				
					Total	Fr.		840.10

ECHNUNG FÜR Herrn Hans R a m s t e i n - Gerster

M u t t e n z .

1933.						Betrag
				<u>E i n f a m i l i e n h a u s</u>		
				<u>in den Reben.</u>		
				A. Maurer- <u>Erd- und Verputzarbeiten.</u>		
			1.	Aushub von Humus ca. 30 cm tief		
				68.69 m ³	2.80	192.35
			2.	Aushub der Baugrube und der Fundamente		
				164.47 m ³	3.20	526.30
			3.	Erstellen des Fundamentbetons		
				31.45 m ³	23.50	739.10
			4.	Aufgehendes Betonmauerwerk inkl. Schalungen		
				63.97 m ³	32.--	2.047.05 X
			5.	Terrassenbrüstung und Lichtschachtwände 15 cm stark, in Cementbeton, leicht armiert		
				14.46 m ²	12.50	180.75
			6.	Aufgehendes Backsteinwerk in verlängertem Cementmörtel gemauert		
				70.854 m ³	59.--	4.180.40 X
			7.	Backsteinwände 15 und 12 cm stark		
			a.	15 cm stark		
				21.29 m ²	9.--	191.60 X
			b.	12 cm stark		
				62.25 m ²	7.20	448.20 X
				Transport:		8.505.75

ZAHLBAR INNERT 30 TAGEN

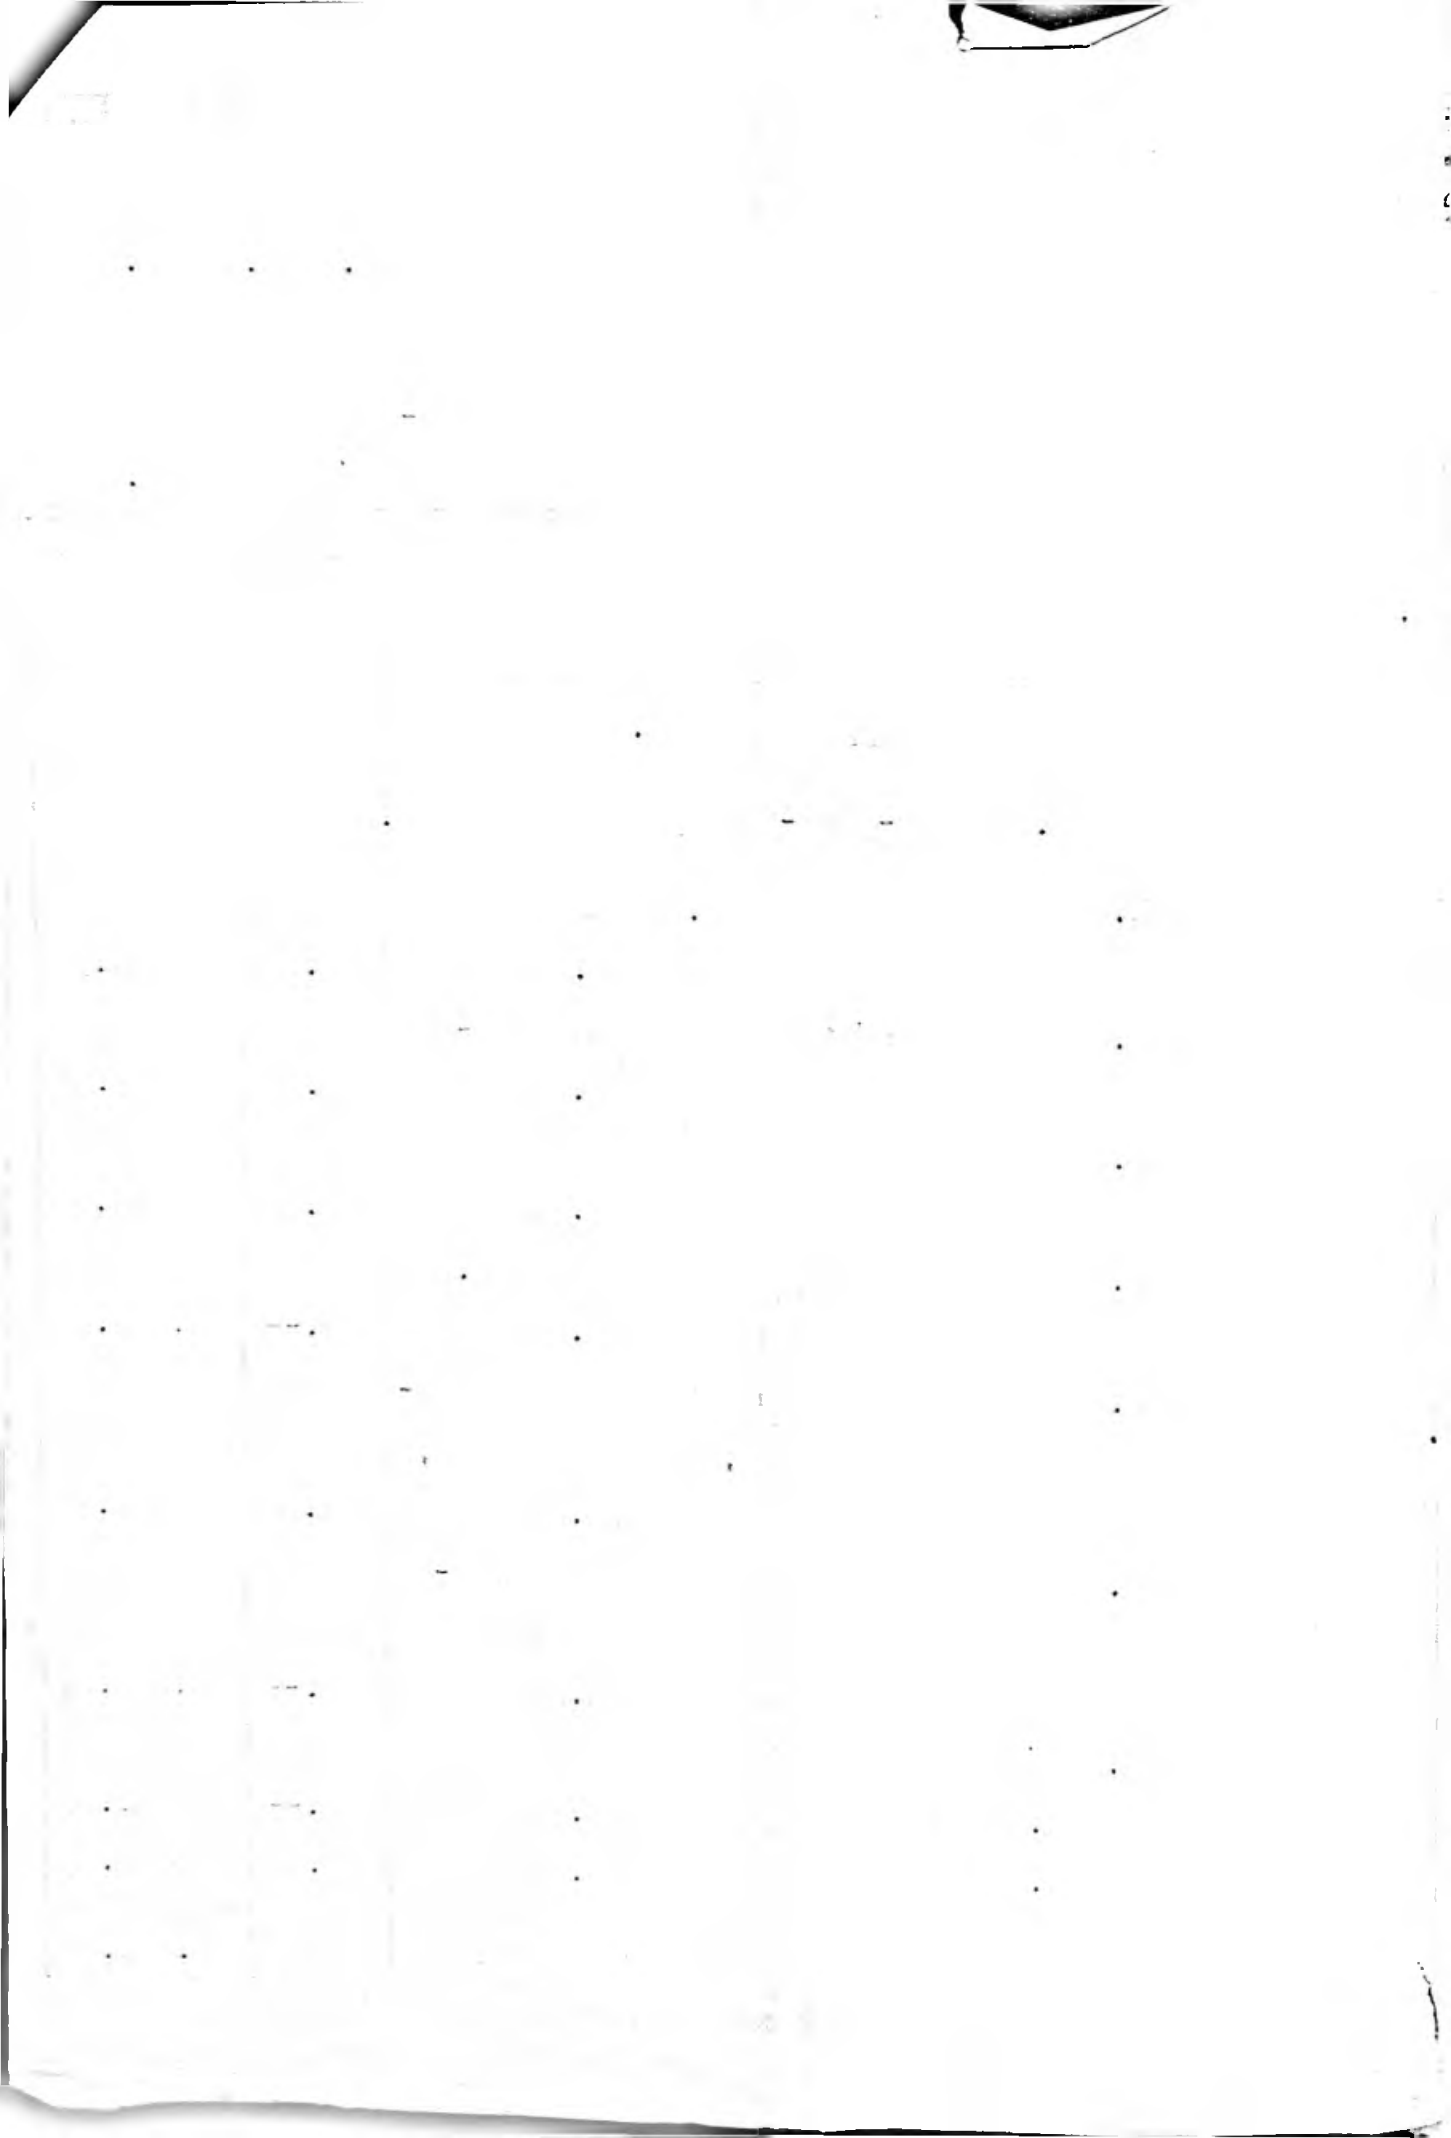

33					Betrag	
				Transport:	8.505,75	
	8.	Erstellen der Betonpfetten unter die Gebälke, 30 cm hoch				
		a. 15 cm stark	9.00 m ^l	3.60	32.40	
		b. 12 cm stark	9.00 m ^l	2.90	26.10	
	9.	Erstellen der Schlackenplattenwände, 8 cm stark			6.--	275.40
			45.90 m ²			
	10.	Erstellen der Schlackenplattenwände, 6 cm stark			4.80	213.40
			44.46 m ²			
	11.	Betonböden 15 cm stark, inkl. 2½ cm starkem Cementüberzug im Keller und hinter dem Hause			7.--	918.10
			131.16 m ²			
	12.	Erstellen des Bodens in der Jauchegrube inkl. Glattnstrich, mit Sika-				
		zusatz	2.04 m ²	8.50	17.35	
	13.	Erstellen der Decke über der Jauchegrube in Cementbeton mit Cement-				
		überzug und Glattnstrich	3.25 m ²	10.50	34.15	
	14.	Liefern und Versetzen eines gusseisernen Deckels mit Geruchverschluss				
			1 Stück		46.--	
	15.	Abgeriebener Cementverputz der Wände in der Jauchegrube			4.20	37.65
			8.96 m ²			
	16.	Erstellen der Kellertreppe, ¼ gewunden, in Cementbeton, Tritte mit abgerundeten Kanten.				
		a. Gerade Tritte, 95cm lg.	7 Stück	9.50	66.50	
		b. Gewundene Tritte, im Mittel				
		1.05 m ^l lang	6 Stück	14.50	87.--	
		Transport:			10.259.80	

				Betrag
13.			Transport:	10.259.80
17.	Erstellen der Differenzterappe im Vorplatz, in Granitimitation, sauber überarbeitet.			
	Tritte 1.20 m lang	3 Stück	16.50	.49.50
18.	Erstellen der Hauseingangstreppe in Granitimitation, sauber überarbeitet			
	a. Tritte 1.20 m lang	8 Stück	16.50	132.--
	b. Podestplatte	1 Stück		44.--
19.	Erstellen der armierten Betonplatte über die Hauseingangstüre 1 Stück			58.--
20.	Erstellen der Differenzterappe bei der äusseren Verandatüre, in Granitimitation, überarbeitet. Tritte 1.30 m lang.	3 Stück	18.--	54.--
21.	Liefern und Versetzen des I. Eisengebälkes über dem Keller im INP 14 und II NP10	747 kg	--.30	224.10
22.	Liefern und Verlegen der Hourdis zwischen das Eisengebälk über dem Keller	68.71 m ²	4.30	295.45
23.	Ueberbeton auf die Hourdis ca. 6 cm stark	68.71 m ²	2.40	164.90
24.	Erstellen der armierten Betondecke über dem Vorkeller, 12 cm stark, inkl. 2 cm starkem Cementüberzug mit Sikazusatz	26.82 m ²	16.50	442.55
	Zuschlag für die Ausbildung der Rinne	8.40 m ¹	2.80	23.55
	Transport:			11.747.85

33.								Belrag
					Transport:			11.747,85
	25.	Liefern und Versetzen eines Schofer						
		kamins 20/20 cm, zweizügig						
			12.60 m ¹	32.50				409.50
		Zuschlag für Kaminhut No. 1						39.--
	26.	Liefern und Versetzen Russtüren						
		No. 5	4 Stück	17.--				68.--
	27.	Liefern und montieren einer Dampf-						
		klappe	1 Stück	18.50				18.50
	28.	Liefern und Versetzen von Futter-						
		rohren	2 Stück	3.50				7.--
	29.	Erstellen der Kaminausrollungen						
		pauschal						18.--
	30.	Erstellen der armierten Betondecke						
		über der Veranda, inkl. Gefällsbeton						
		als Unterlage für den Asphaltbelag						
		sowie Ueverzug mit Drahtgeflecht-						
		armierung	16.90 m ²	19.--				321.10
		Zuschlag für Ausbilden der Rinne						
			10.80 m ¹	2.80				30.25
	31.	Erstellen einer 2 cm starken Asphalt						
		Isolierschicht aus natürlichem						
		Travers-Asphalt mit Bitumenzusatz						
		und Trinidadasphalt	16.90 m ²	10.50				177.45
		Erstellen der Verticalborden längs						
		den Mauern in 8 cm Höhe	5.00 m ¹	2.50				12.50
		Borden bei Geländerpfosten, 5 cm Ø						
			6 Stück	- .90				5.40
	32.	Erstellen des armierten Betonstur-						
		zes bei der Veranda	1.89 m ³	110.--				207.90
					Transport:			13.062.45

				Belrag
33.			Transport:	13.062.45
33.	Lief ern und Versetzen eines Schütt-			
	steins mit Abtropfbrett, Marke			
	Limmat, in Feuerton inkl. Unter-			
	mauerung	pauschal		130.--
34.	Liefern und einbringen von trocke-			
	nen Schlacken in die Schiebböden			
		111.50 m ²	1.80	200.70
35.	Abdecken der Gebälke mit Dachpappe			
	und erstellen des Schlackenbetons			
	zur Aufnahme des Plättlibelages im			
	Badezimmer	5.28 m ²	4.50	23.75
36.	Erstellen von Türschwellen in Cement-			
	beton im Keller, inkl. liefern und			
	versetzen von Kantenschutzzeisen			
	a. mit doppelten Kantenschutzzeisen			
	1.46 m lang	1 Stück	16.--	16.--
	0.77 m "	1 "	9.--	9.--
	0.94 m "	1 "	10.--	10.--
	b. mit einfachen Kantenschutzzeisen			
	0.78 m lang	1 Stück	6.50	6.50
	1.17 m "	1 "	9.60	9.60
37.	Erstellen der Kalkmörteldecke, inkl.			
	weisseln in der Waschküche			
		13.10 m ²	3.90	51.10
38.	Verputzen der Wände in Schwarzkalk-			
	mörtel in der Waschküche, inkl.			
	weisseln	32.76 m ²	3.30	108.10
			Transport:	13.627.20

33.									Betrag
					Transport:				13.627.20
	39.	Abgeriebener Schwarzkalkverputz im Kellervorplatz und im Heizungsraum inkl. weisseln	68.64 m ²	3.30					226.50
	40.	Weisseln der Betonwände in den Kellerräumen	161.78 m ²	- .35					56.65
	41.	Erstellen des Sockelverputzes in Cementmörtel, glatt abgerieben	27.70 m ²	4.20					116.35
	42.	Erstellen des Fassadenverputzes, bestehend aus einem Grundputz in verlängertem Cementmörtel und einem Aufputz, horizontal abgezogen, inkl. weisseln	288.84 m ²	4.30					1.242.--
	43.	Erstellen der Dachuntersichten auf Drahtziegelgewebe, inkl. Verputz wie Fassaden	9.36 m ²	9.--					84.25
	44.	Erstellen eines Betonpfostamentes unter dem Holzpfosten für den Schopf auf der Bergseite	pauschal						6.--
	45.	Erstellen der Türschwellen bei den Terrassentüren in Granitimitation	1.20 m ¹ lang						9.50
			0.85 m ¹ "						7.20
	46.	Cementverputz auf der innern Seite der Terrassenbrüstung	14.13 m ²	3.20					45.20
	47.	Erstellen der Brüstungsabdeckung bei der Terrasse	15.10 m ¹	6.--					90.60
					Transport:				15.511.45

				Betrag
3,				
	48.	Transport:		15.511.45
	48.	Erstellen der Türschwelle beim Hauseingang in Granitimitation, 1.00 m ^l lang	pauschal	8.--
	49.	Verputzen der Kellerfensterrahmen		
		5 Stück	4.50	22.50
		Zisammen		15.541.95
				=====
		<u>B. Stützmauer hinter dem Hause (Bergseite)</u>		
	1.	Aushub der Fundamente und Abtrag		
		7.78 m ³	3.20	24.90
	2.	Betonieren der Fundamente		
		3.45 m ³	23.50	81.10
	3.	Aufgehendes Betonmauerwerk inkl. Schalung		
		3.54 m ³	32.--	113.30
	4.	Anbringen des Cementverputzes, glatt abgerieben		
		25.03 m ²	3,20	80.10
		Zusammen		299.40
				=====
		<u>C. Einfriedigung längs der Schlossbergstrasse.</u>		
	1.	Abtrag der Böschung und Aushub der Fundamente		
		11.88 m ³	3.20	38.--
	2.	Betonieren der Fundamente in P.C. 125		
		3.65 m ³	23.50	85.80
	3.	Aufgehender Beton, ein- und zweiseitig eingeschalt, mit Anzug, in P.C. 175		
		5.46 m ³	34.--	185.65
	4.	Erstellen der Pfostamente		
		4 Stück	9.50	38.--
		Transport		347.45

				Betrag	
133.				Transport:	347.45
			5.	Verputz der Mauer & der Pfostamente 31.20 m ²	3.20 99.85
			6.	Erstellen der Abdeckungen 15.18 m ¹	1.50 22.75
			7.	Erstellen der Tritte in Cementbeton leicht abgerundet, 1.50 m ¹ lang 4 Stück	12.-- 48.--
			8.	Erstellen der beiden Seitenwangen, 15 cm stark, inkl. Verputz 2.78 m ²	10.50 29.20
			9.	Erstellen des Cementbodens, 12 cm stark inkl. 2 cm Cementüberzug 2.37 m ²	7.80 18.50
				Zusammen	565.75
				D. Tagelohnarbeiten pro 1932.	
				Total pro 1932 laut besonderer Rechnung vom 31. Dezember 1932	840.10
				E. Tagelohnarbeiten pro 1933.	
1933	M.	H.	A.		
an.	14.	2	2	Treppenöffnung in der alten Reb- mauer zugemauert 1 \$ Cement 3 Karren Kies	3.20 3.20 -.50 1.50
ärz	27.		1	Für Umzug von Möbeln	
"	28.		2	" " " "	
pril	5.		1	" " " "	
				Versetzen von Platten, Grund verführen Wäschehänge etc.	
	22.	5		22 Stk. armierte Treppenplatten	
	24.	9	4	4 " " " 1.50 m lang	3.-- 66.--
				1.20 m "	2.60 10.40
	16	6	4	Transport:	81.10

1933.		M.	H.	A.					Betrag
		16	6	4		Transport:			81.10
April	25.	9	18		17 Stk. Armierte Treppenplatten				
					2 " " " 1.00 m lang	2.40		40.80	
					2 " " " 1.80 m "	3.20		6.60	
	27.	9	18		2 \$ Cement	3.20		6.40	
					2 Spitzseisen	-.50		1.--	
					1 Schlageisen	-.50		-.50	
	28.	9			54 Stk. Betonpföstchen	-.50		27.--	
	29.	5							
ai	2.	9							
	15.	4	4		2 alte Gewände 1.20 m ^l lang X	3.60		7.20	
	16.		9		2 Spitzseisen	-.50		1.--	
	17.		9		<u>Kellerentwässerung.</u> X				
	18.		9		4 \$ Cement	3.20		12.80	
	19.		9		1.00 m ³ Mischung	7.80		7.80	
	20.		10		0,15 m ³ r.Sand	14.--		2.10	
	22.		9		1.00 m ³ Bollen	7.80		7.80	
	23.		9		7.00 m ^l Drainierrö hren 2	2.50		17.50	
	24.		9		7.00 m ^l Cementröhren 10er	1.90		13.30	
	26.		9		2.Cementrohrbogen 45o 10er	2.60		5.20	
	27.		5		4 Spitzseisen	-.50		2.--	
			69		<u>Transport der Fässer.</u>			68.50	
Sept.	12.		2½	2½					
"	14.		½	½					
"	16.		1	1					
		61			Std Maurer	2.30		140.30	
			137		" Handlanger	1.80		246.60	
				8	" Auto	6.--		48.--	
					Zusammen			675.00	

1933.


<u>Für Kanalisationsarbeiten.</u>				Betrag
1.	Erstellen der Cementrohrleitungen inkl. ausheben und wiedereinfüllen der Gräben, sowie Liefern & Verset- zen der Röhren.			
a.	i/Cementrohr 10 cm Ø i/L. mittl. Grabentiefe 50 cm	27.50 m ^l	3.90	107.25
b.	i/Cementrohr 12 cm Ø i/L. mittlere Grabentiefe 50 cm	15.00 m ^l	4.10	61.50
c.	i/Cementrohr 15 cm Ø i/L. mittlere Grabentiefe 80 cm	25.50 m ^l	5.60	142.80
d.	Zuschläge			
	Abzweiger 15/12 cm	2 Stk.	9.20	18.40
	Bogen 10 cm Ø i/L. 45°	4 Stk.	2.20	8.80
	" 10 cm Ø i/L. 90°	3 Stk.	3.--	9.--
	" 12 cm Ø i/L. 45°	6 Stk.	2.70	16.20
	" 15 cm i/L. 45°	1 Stk.	3.20	3.20
2.	Liefern & Versetzen eines Tauchbo- gens			4.60
3.	Liefern & Versetzen von Beton - Schlam- sammlern flr die Dachwasserablei- tung, 30 cm Ø i/L. inkl. Rahmen und Gussdeckel	2 Stk.	36.--	72.--
4.	Liefern & versetzen von Guss-Samm- lern mit Sinkkasten in der Waschküche und im Vorkeller	2 Stk. ² / ₇	32.--	64.--
5.	Liefern & versetzen von Geruchver- schluss-Glockensammlern hinter dem Hause	2 Stk.	12.--	24.--
Uebertrag:				531.75

1933.							Betrag
				Uebertrag:			531.75
			6.	Erstellen der Drainageleitung ausserhalb des Hauses inkl. liefern und versetzen der Drainierrohre 12 cm Ø i/L.	24.00 m ¹	4.40	105.60
				Zuschlag für 3 Bogen 90°	3 Stk.	3.40	10.20
			7.	Erstellen eines Revisionschachtes vor dem Hause, in Cementsteinen gemauert mit Cementverputz und Betondeckel	pauschal		57.--
							704.55
				<u>G. Kunststeinlieferung.</u>			
				Liefern und versetzen der Kunststeine für die Tür und Fenstereinfassungen, Fensterbänke etc. in grau, glatter Ausführung	5.202 m ²	125.--	650.25
				<u>H. Dachdeckerarbeiten.</u>			
			1.	Eindecken der Dachflächen als Doppeldach mit altrot-engobierten Nasenziegeln, Ia. Qualität, inkl. Dachlattung	121.90 m ²	6.80	828.90
			2.	Eindecken der First mit Firstziegeln Ia. Qualität, altrot-engobiert, inkl. Firstlatte und auf Dachpappeunterlage	8.40 m ¹	4.90	41.15
			3.	Eindecken des Schopfes mit Eternit 30/60 cm, geschlaufte Deckung, inkl. Lattung	16.40 m ²	10.80	177.10
				Uebertrag:			1047.15

53.						Betrag
				Uebertrag:		1.047.15
			4.	Eindecken der Gräte mit kleinen Eternit-Hohlklappen 20/12 inkl. Firstlatte	5,40 m ^l	7.80
						42.10
						1.089.25
				<u>H. Boden- und Wandbeläge.</u>		
			1.	Liefern und verlegen von Bodenplatten Ia Qualität 6-Eck, grau Porphyrt, inkl. Erstellen der erforderl. Unterlage	32.05 m ²	14.20
						455.10
			2.	Liefern und versetzen von Sockelplatten grau Porphyrt, Ia Qual. 10 cm hoch mit Fase, inkl. Ecken, inkl. Cementanwurf	14.30 m ^l	4.20
						60.05
			3.	Liefern und verlegen von Bodenplatten Ia Qual. 6-Eck 10 cm in grün Porphyrt inkl. erstellen der Betonunterlage	5.25 m ²	15.70
						82.45
			4.	Liefern und versetzen von Sockelplatten grün Porphyrt Ia Qual. 15 cm hoch mit Fase inkl. Ecken und Cementanwurf	9.00 m ^l	5.70
						51.30
			5.	Liefern und verlegen von Wandplatten creme glacierte I Qual. inkl. erstellen des Cementanwurfes	5.30 m ²	19.90
						105.45
			6.	Zuschlag für Abdeckplatten und Ecken	7.60 m ^l	1.--
						7.60
			7.	Zuschlag für Seifenschale 1 Stk.		4.--
						4.--
				Uebertrag:		765.95

33		Betrag
	Uebertrag:	765.95
	8. Liefern und verlegen von Wandplatten Majolika No. 3528 I Qual. inkl. er- stellen des Cementanwurfes 11.45 m ²	23.20 265.65
	9. Zuschlag für Abdeckplatten und Ecken 8.70 m ²	1.-- 8.70
	10. Zuschlag für Seifenschalen 2 Stk.	4.-- 8.--
		1.048.30 =====
	<u>K. Jn Unterakkord vergebene Arbeiten.</u>	
	Zimmerarbeiten laut Rechnung H. Eisen- hut vom 13. Febr. 1933	3.986.65
	Spenglerarbeiten laut Rechnung A. Häusermann vom 29. Nov. 1932	501.75
	Gipserarbeiten laut Rechnungen Fr. Stöckli vom 7. Januar 1933 2008.70 vom 13. Febr. 1933 60.95	2.069.65
	Sanitäre Installationen, Wäsche- hänge, Schaukel mit Reck und Ein- friedigung laut Rechnung H. Gautschi vom 10. Juli 1933	2.803.90
	Glaserarbeiten, Fenster und Türen laut Rechnungen der Fensterfabrik Kiefer Zürich-Wollishofen vom 27. Okt. 1932 2157.-- vom 14. Dez. 1932 134.--	2.291.--
	Innere Schreinerarbeiten lt. Rechnung E. Widmer vom 26. Mai 1933	2.506.40
	Elektrische Installationen lt. Rech. Ad. Siegrist, Binningen vom 7. April 1933	970.50
	" " " vom 18. Mai 1933	26.--
	Uebertrag:	15.155.85

933		Betrag
	Uebertrag:	15.155.85
	Parkettarbeiten laut Rechnung H. Bitterlin Basel vom 18. Jan. 1933	2 446.40
	Inlaidarbeiten laut Rechnungen Paul Matzinger Basel vom 28. März 1933 545.40	
	8. Juli 1933 51.10	596.50
	Jalusielen und Balkonvortüren lt. Rechnung Wilh. Baumann Horgen vom 30. Nov. 1932	515.--
	Türschonerlieferung laut Rechnung der Balloid A.g. Therwil vom 30. März 1933	97.85
	Centralheizungsanlage laut Rechnung H. Gautschi vom 31. Dezember 1932	2.550.--
	Schlosserarbeiten laut Rechnung Gottl. Meier vom 20. Juli 1933	479.55
	Malerarbeiten laut Rechnung Ernst Mesmer vom 28. Dezember 1933	1.820.75
	Tapetenlieferung laut Rechnung W. Wirz - Wirz A.G. Basel vom 28. Februar 1933	316.55
	Einfriedigung laut Rechnung J. Müller Löhningen vom 5. Dezember 1932	265.--
	Mergellieferung laut Rechnung Max Frey - Oser vom 31. Januar 1933	91.--
	Splitterlieferung laut Rechnung K. Meyer. Spinnler vom 30. November 1932	24.--
	Geometerkosten laut Rechnung J. Meyer Dornach vom 21. Juni 1932	20.--
	Anschlussbeitrag an die Elektra Birseck Münchenstein	100.--
	Uebertrag:	22.478.45

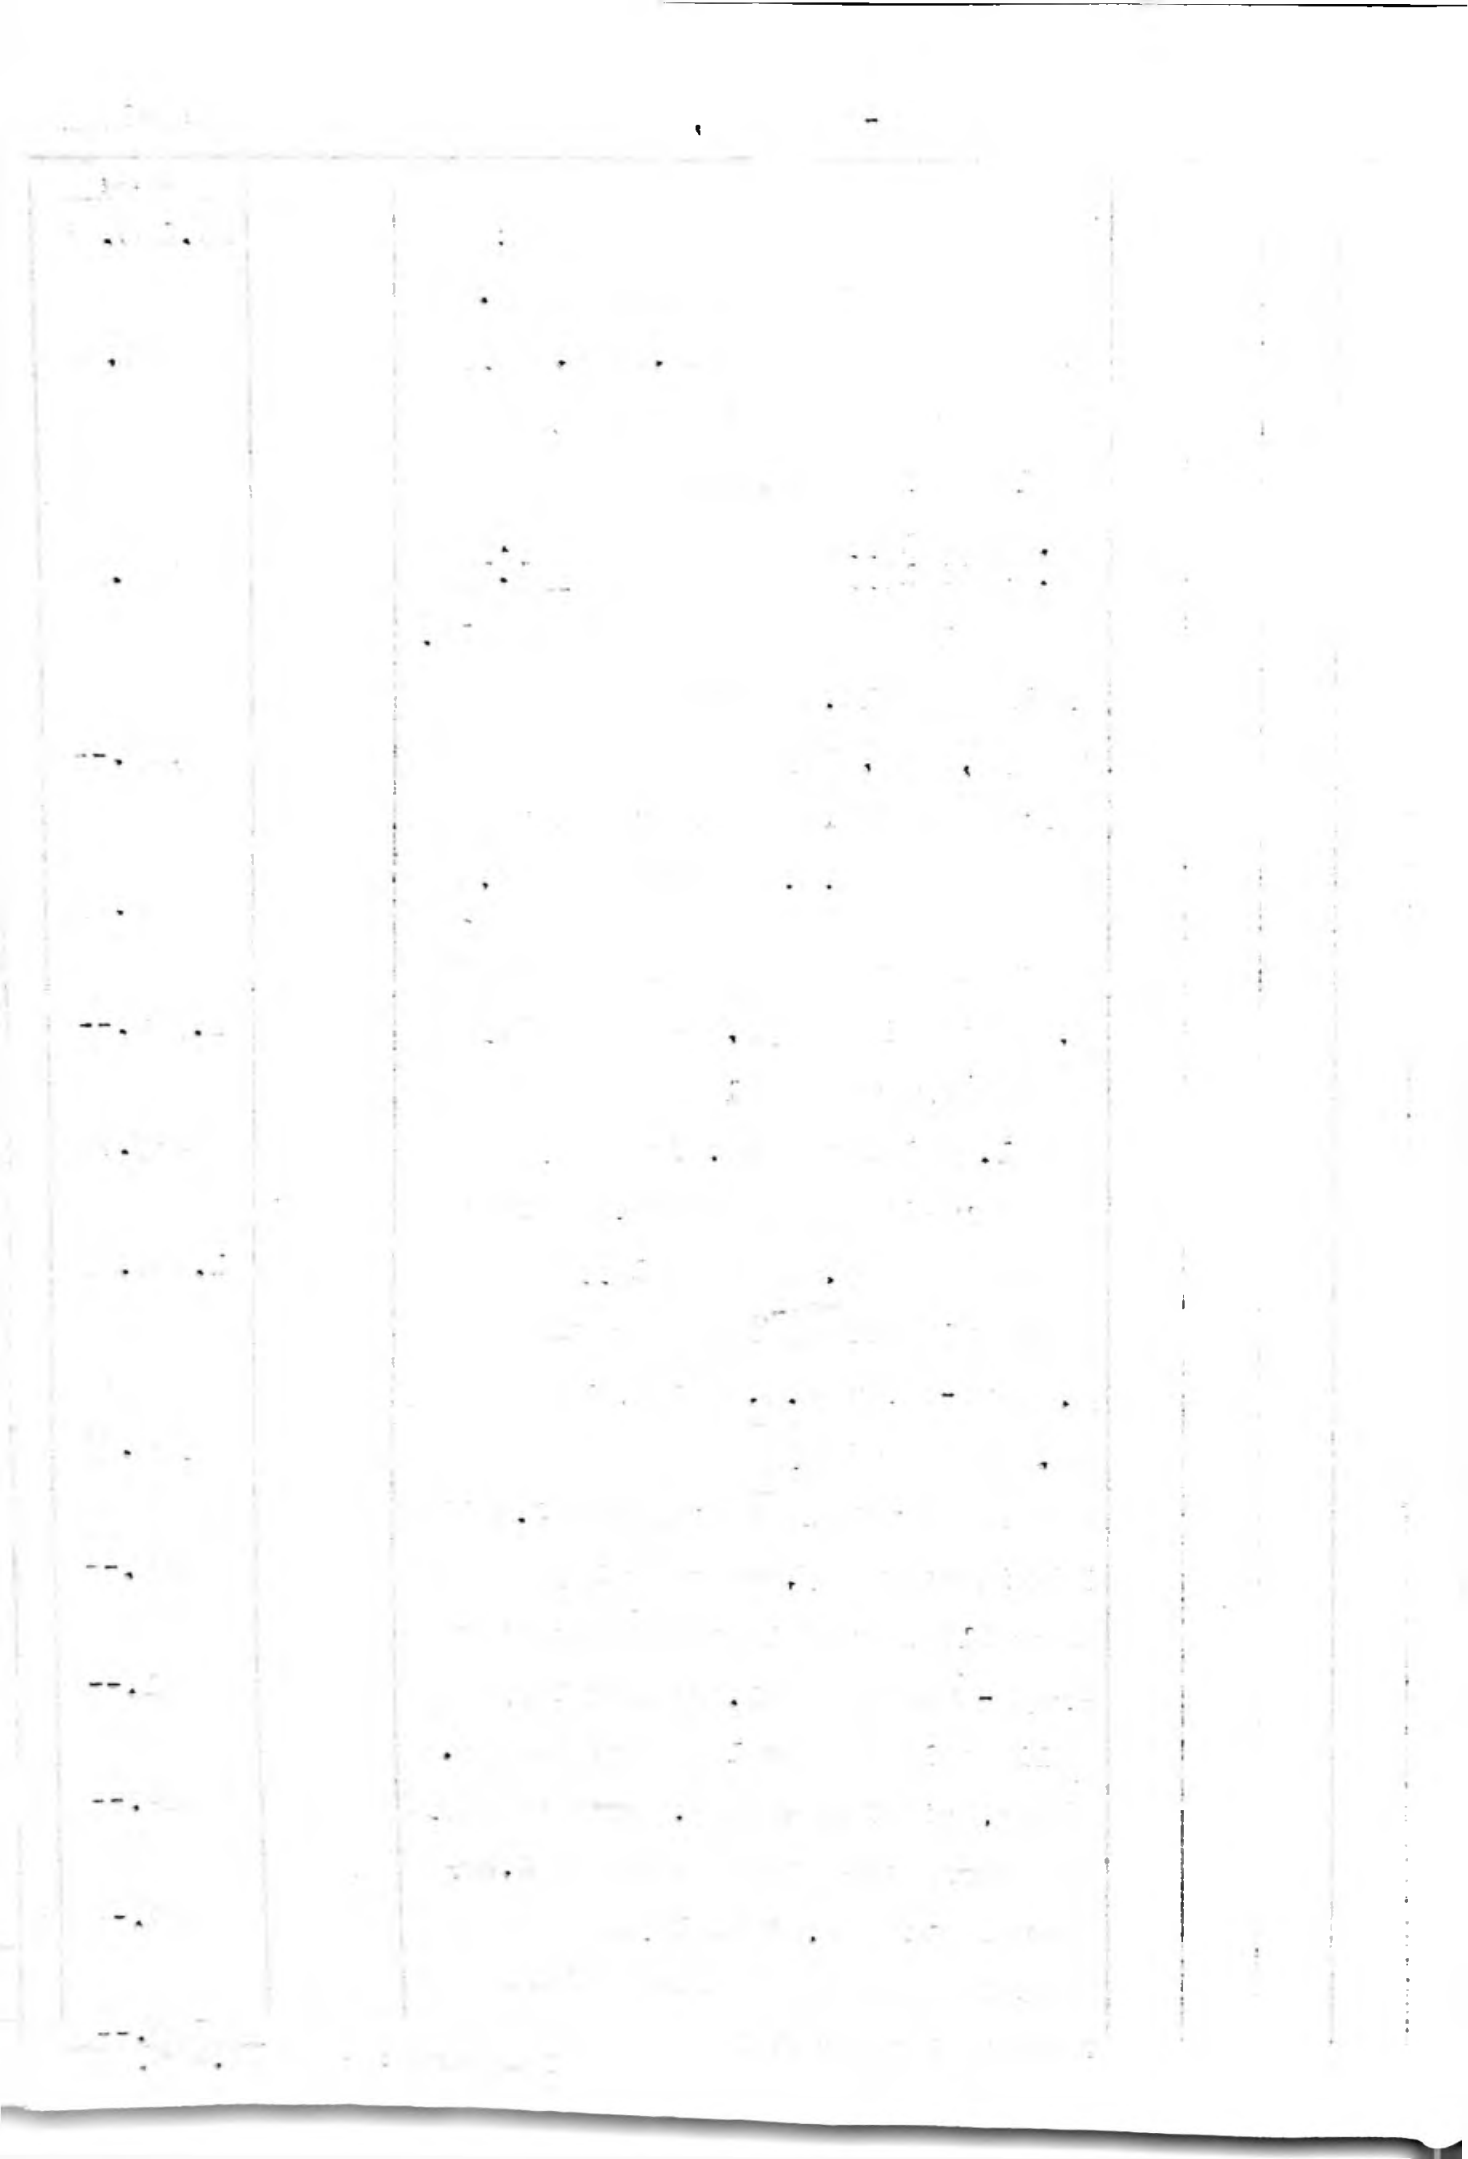

			Betrag
Uebertrag:			22.478.45
Wasseranschlussleitung lt. Rechnung der Einwohnergemeinde			240.35
			22.718.80
Bauleitung und Pläne 5%			1.135.95
ab <u>Fr. 22.718.80</u>			23.854.75
			=====
<u>Kostenzusammenstellung.</u>			
a.	Erd-Maurer-und Verputzarbeiten	15.541.95	✓
b.	Stützmauer hinter dem Hause (Bergseite)	299.40	✓
c.	Einfriedigung längs der Schlossberg- strasse	565.75	✓
d.	Tagelohnarbeiten pro 1932	840.10	✓
e.	" " " 1933	675.--	✓
f.	Kanalisationsarbeiten	704.55	✓
g.	Kunststeinlieferung	650.25	✓
h.	Dachdeckerarbeiten	1.089.25	✓
i.	Boden-und Wandbeläge	1.048.30	✓
k.	In Unterakkord vergebene Arbeiten		
	inkl. Bauleitung & Pläne	23.854.75	✓
	Total Bausumme		45.269.30 ✓
abzüglich Ihre àConto-Zahlung durch den Baukredit der Kantonalbank Liestal vom			
26.	August 1932	13.200.--	✓
16.	September "	3.750.--	✓
14.	Oktober "	900.--	✓
2.	November "	7.700.--	✓
3.	Dezember "	2.100.--	✓
Uebertrag:			27.600.--

933.																							

TELEPHON SAFRAN 6011

STECHEKKONTO V 1524

RECHNUNG FÜR Herrn H.

Schlossbe

1934		M.	H.	L.	<u>Dachumdecken am Ha</u>
	Okt. 26.	7½		7½	1 Bd. Schindeln 12.50 m² Dachlatten 6 kg Stiften 18 - 75 12 kg Cement 0.05 m³ rein Sand
	" 27.	4		4	4 Bd. Schindeln 3.50 Bdm. Dachlatten ½ \$ Cement 0.10 m³ rein Sand 12.00 Bdm. Dachlatten 20.00 m² Dachpappe
	29.	8	8	8	
	30.	8	8	8	5 Bd. Schindeln
	31.	7½	6½	4	15.00 Bdm. Dachlatten 2 Bd. Schindeln 1 \$ Cement 0.10 m³ rein Sand 400 Stk. N'ziegel altrot engob. ¾ Std. Auto
		6½	6½	6½	2 Hohlziegel d'engobiert
		41½			3 Doppelfalzziegel
			29	38	

ZAHLBAR INNER 30 TAGE

N * BAUGESCHÄ

MUTTENZ, DEN 30. November 193

Ramstein-Gerster

rgstrasse Muttenz.

<u>aus, Kirchplatz.</u>		Betrag
	3.--	3.--
	-.15	1.90
	-.55	3.30
	-.08	-.95
	12.50	-.65
	3.--	12.--
	1.40	4.90
	3.--	1.50
	12.50	1.25
	1.40	16.80
	-.50	10.--
	3.--	15.--
	1.40	21.--
	3.--	6.--
	3.--	3.--
	12.50	1.25
	14.60	58.40
	7.--	5.25
	1.30	2.60
	-.30	

& E. JOURDAN * BAUGESCHÄFT

LEPHON SAFRAN 6011

CHECKKONTO V 1524

MUTTENZ, DEN 30. November 1934.....


RECHNUNG FÜR Herrn H. Ramstein - Gerster
 Schlossbergstrasse Muttenz.

		M.	H.	L.			Betrag
934					<u>Dachumdecken am Haus, Kirchplatz.</u>		
kt.	26.	7½		7½	1 Bd. Schindeln	3.--	3.--
					12.50 m² Dachlatten	-.15	1.90
					6 kg Stiften 18 - 75	-.55	3.30
					12 kg Cement	-.08	-.95
					0.05 m³ rein Sand	12.50	-.65
"	27.	4		4	4 Bd. Schindeln	3.--	12.--
					3.50 Bdm. Dachlatten	1.40	4.90
					½ \$ Cement	3.--	1.50
					0.10 m³ rein Sand	12.50	1.25
					12.00 Bdm. Dachlatten	1.40	16.80
					20.00 m² Dachpappe	-.50	10.--
	29.	8	8	8			
"	30.	8	8	8	5 Bd. Schindeln	3.--	15.--
"	31.	7½	6½	4	15.00 Bdm. Dachlatten	1.40	21.--
					2 Bd. Schindeln	3.--	6.--
					1 \$ Cement	3.--	3.--
					0.10 m³ rein Sand	12.50	1.25
					400 Stk. N'ziegel altrot engob.	14.60	58.40
					¾ Std. Auto	7.--	5.25
Nov.	1.	6½	6½	6½	2 Hohlziegel d'engobiert	1.30	2.60
		41½			3 Doppelfalzziegel	-.30	-.90
			29	38			

IRB.

ZAHLBAR INNERT 30 TAGEN Ueberträge:

169.65

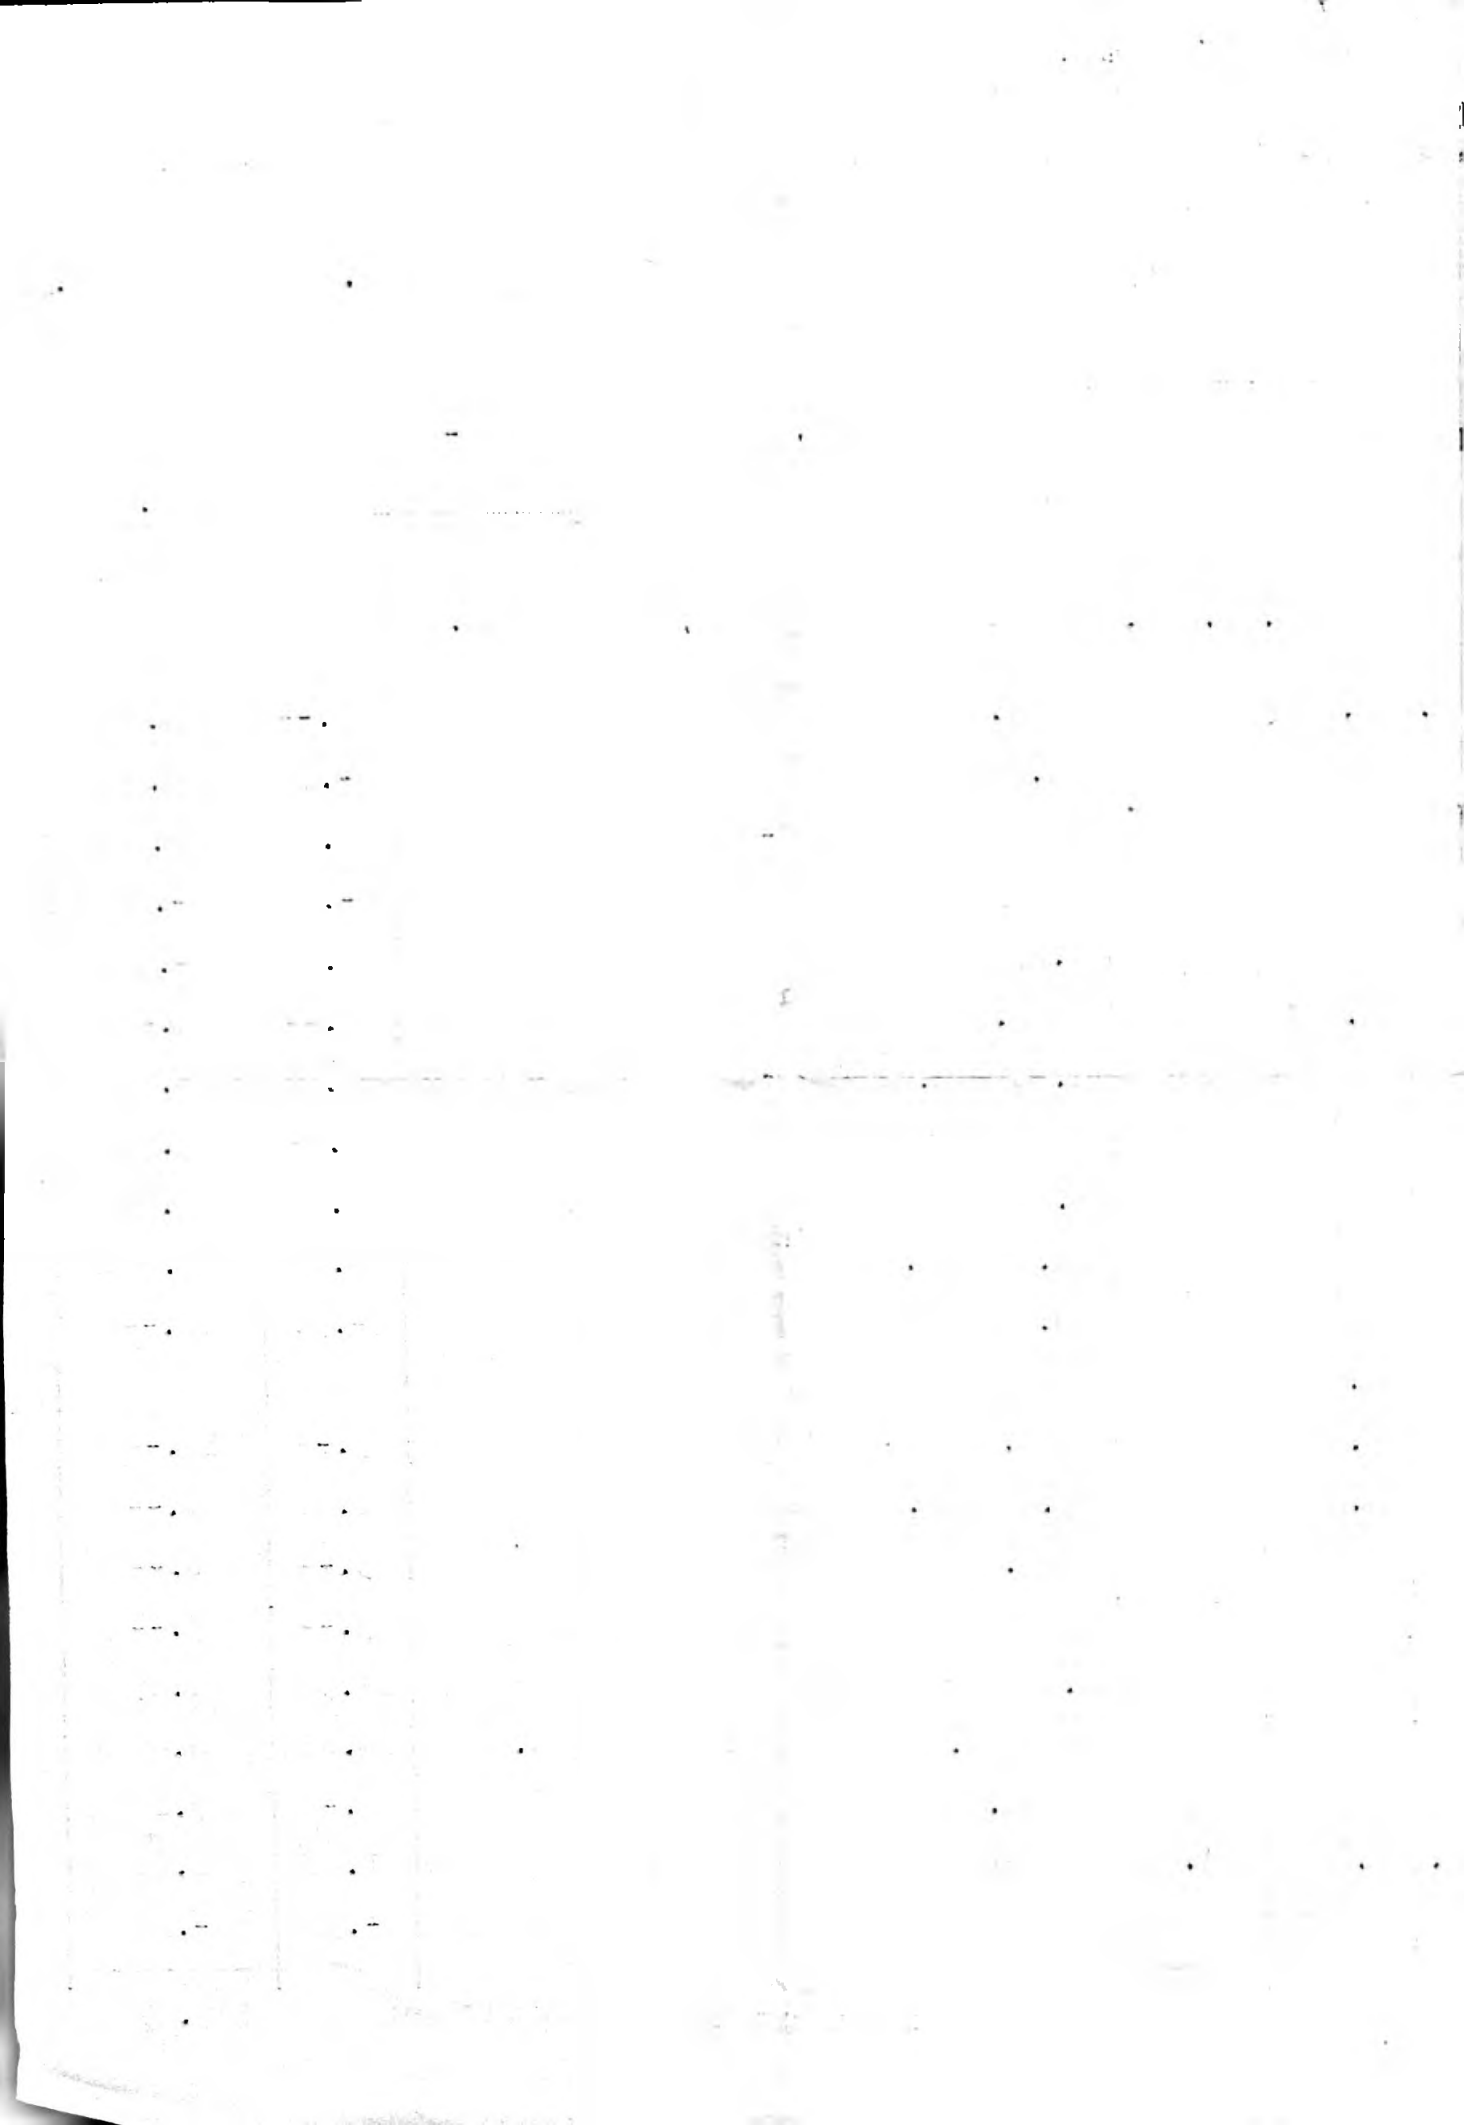

		M.	H.	L.			Betrag
		41½	29	38	Ueberträge:		169.65
					0.10 m³ rein Sand	12.50	1.25
					½ \$ Cement	3.--	1.50
v.	2.	8	8	8	4 Bd. Schindeln	3.--	12.--
					0.05 m³ rein Sand	12.50	-.65
	3.	4	4				
	5.	8	8	8			
	6.	8	8	4	4 Bd. Schindeln	3.--	12.--
	7.	8	8		4 Bd. "	3.--	12.--
					404 Stk. N'ziegel altrot engob.	14.60	59.--
					¾ Std. Auto	7.--	5.25
	8.	2	2				
	9.	8	8	8	8 Bd. Schindeln	3.--	24.--
					3 kg Stiften	-.55	1.65
	10.	4		4			
	12.	8	8	8	1 \$ Cement	3.--	3.--
					0.10 m³ rein Sand	12.50	1.25
					8.00 Bdm. Dachlatten	1.40	11.20
					700 Stk. N'ziegel altengob.	14.60	102.20
					¾ Std. Auto	7.--	5.25
	13.	8	8	8			
	14.	16	8		5 Stk. 1½ N'ziegel altengob.	-.30	1.50
					7 Bd. Schindeln	3.--	21.--
					0.10 m³ rein Sand	12.50	1.25
					20 kg Cement	-.08	1.60
					1 kg Grenoble	-.25	-.25
	15.	16	8		10 Bd. Schindeln	3.--	30.--
					4.00 Bdm. Dachlatten	1.40	5.60
		139½			50 Stk. N'ziegel altengob.	14.60	7.30
			107	86	2 " Hohl " " Fig.61	1.30	2.60
					Ueberträge:		492.95

Date		Description		Amount	
Jan 1		Balance		100.00	
Jan 5		John Doe		50.00	
Jan 10		John Doe		50.00	
Jan 15		John Doe		50.00	
Jan 20		John Doe		50.00	
Jan 25		John Doe		50.00	
Jan 30		John Doe		50.00	
Feb 1		John Doe		50.00	
Feb 5		John Doe		50.00	
Feb 10		John Doe		50.00	
Feb 15		John Doe		50.00	
Feb 20		John Doe		50.00	
Feb 25		John Doe		50.00	
Feb 30		John Doe		50.00	
Mar 1		John Doe		50.00	
Mar 5		John Doe		50.00	
Mar 10		John Doe		50.00	
Mar 15		John Doe		50.00	
Mar 20		John Doe		50.00	
Mar 25		John Doe		50.00	
Mar 30		John Doe		50.00	
Apr 1		John Doe		50.00	
Apr 5		John Doe		50.00	
Apr 10		John Doe		50.00	
Apr 15		John Doe		50.00	
Apr 20		John Doe		50.00	
Apr 25		John Doe		50.00	
Apr 30		John Doe		50.00	
May 1		John Doe		50.00	
May 5		John Doe		50.00	
May 10		John Doe		50.00	
May 15		John Doe		50.00	
May 20		John Doe		50.00	
May 25		John Doe		50.00	
May 30		John Doe		50.00	
Jun 1		John Doe		50.00	
Jun 5		John Doe		50.00	
Jun 10		John Doe		50.00	
Jun 15		John Doe		50.00	
Jun 20		John Doe		50.00	
Jun 25		John Doe		50.00	
Jun 30		John Doe		50.00	
Jul 1		John Doe		50.00	
Jul 5		John Doe		50.00	
Jul 10		John Doe		50.00	
Jul 15		John Doe		50.00	
Jul 20		John Doe		50.00	
Jul 25		John Doe		50.00	
Jul 30		John Doe		50.00	
Aug 1		John Doe		50.00	
Aug 5		John Doe		50.00	
Aug 10		John Doe		50.00	
Aug 15		John Doe		50.00	
Aug 20		John Doe		50.00	
Aug 25		John Doe		50.00	
Aug 30		John Doe		50.00	
Sep 1		John Doe		50.00	
Sep 5		John Doe		50.00	
Sep 10		John Doe		50.00	
Sep 15		John Doe		50.00	
Sep 20		John Doe		50.00	
Sep 25		John Doe		50.00	
Sep 30		John Doe		50.00	
Oct 1		John Doe		50.00	
Oct 5		John Doe		50.00	
Oct 10		John Doe		50.00	
Oct 15		John Doe		50.00	
Oct 20		John Doe		50.00	
Oct 25		John Doe		50.00	
Oct 30		John Doe		50.00	
Nov 1		John Doe		50.00	
Nov 5		John Doe		50.00	
Nov 10		John Doe		50.00	
Nov 15		John Doe		50.00	
Nov 20		John Doe		50.00	
Nov 25		John Doe		50.00	
Nov 30		John Doe		50.00	
Dec 1		John Doe		50.00	
Dec 5		John Doe		50.00	
Dec 10		John Doe		50.00	
Dec 15		John Doe		50.00	
Dec 20		John Doe		50.00	
Dec 25		John Doe		50.00	
Dec 30		John Doe		50.00	
Total				1000.00	

		M.	H.	L.			Betrag
		139½	107	86	Ueberträge:		492.95
ov.	16.	16	8		10 kg Gips	-.09	-.90
					1 Fleckling (0.65 m²)	4.50	2.90
					1 " (0.20 m²)	4.50	-.90
					1½ Std. Auto (Schutt abführen)	7.--	10.50
"	17.		5		1½ " " " "	7.--	10.50
		155½			Std. Maurer	2.20	342.10
			120		Std. Handlanger	1.70	204.--
				86	Std. Lehrling	1.40	120.40
							1'185.15
					Retour: 130 Stk. N'ziegel à 14.60	19.--	
					16.00 m² Dachlatten à -.15	2.40	21.40
					T o t a l :		1'163.75
							=====

QUITTUNG

Fr. 110. —

Von Herrn Hs. Rammstein - Großer

die Summe von

Franken

vierzig

für Anfüllen der Wasserlöcher u. Verarbeiten der
Wegbrüche i. d. "hohlen Gasse" per Gutschrift a. d.
richtig erhalten zu haben, bescheinigt hiermit

Regulierungskosten

Muttens den 28. Okt. 1935

Feldregulierung V. Muttens

Der Kassier: E. Kretz
